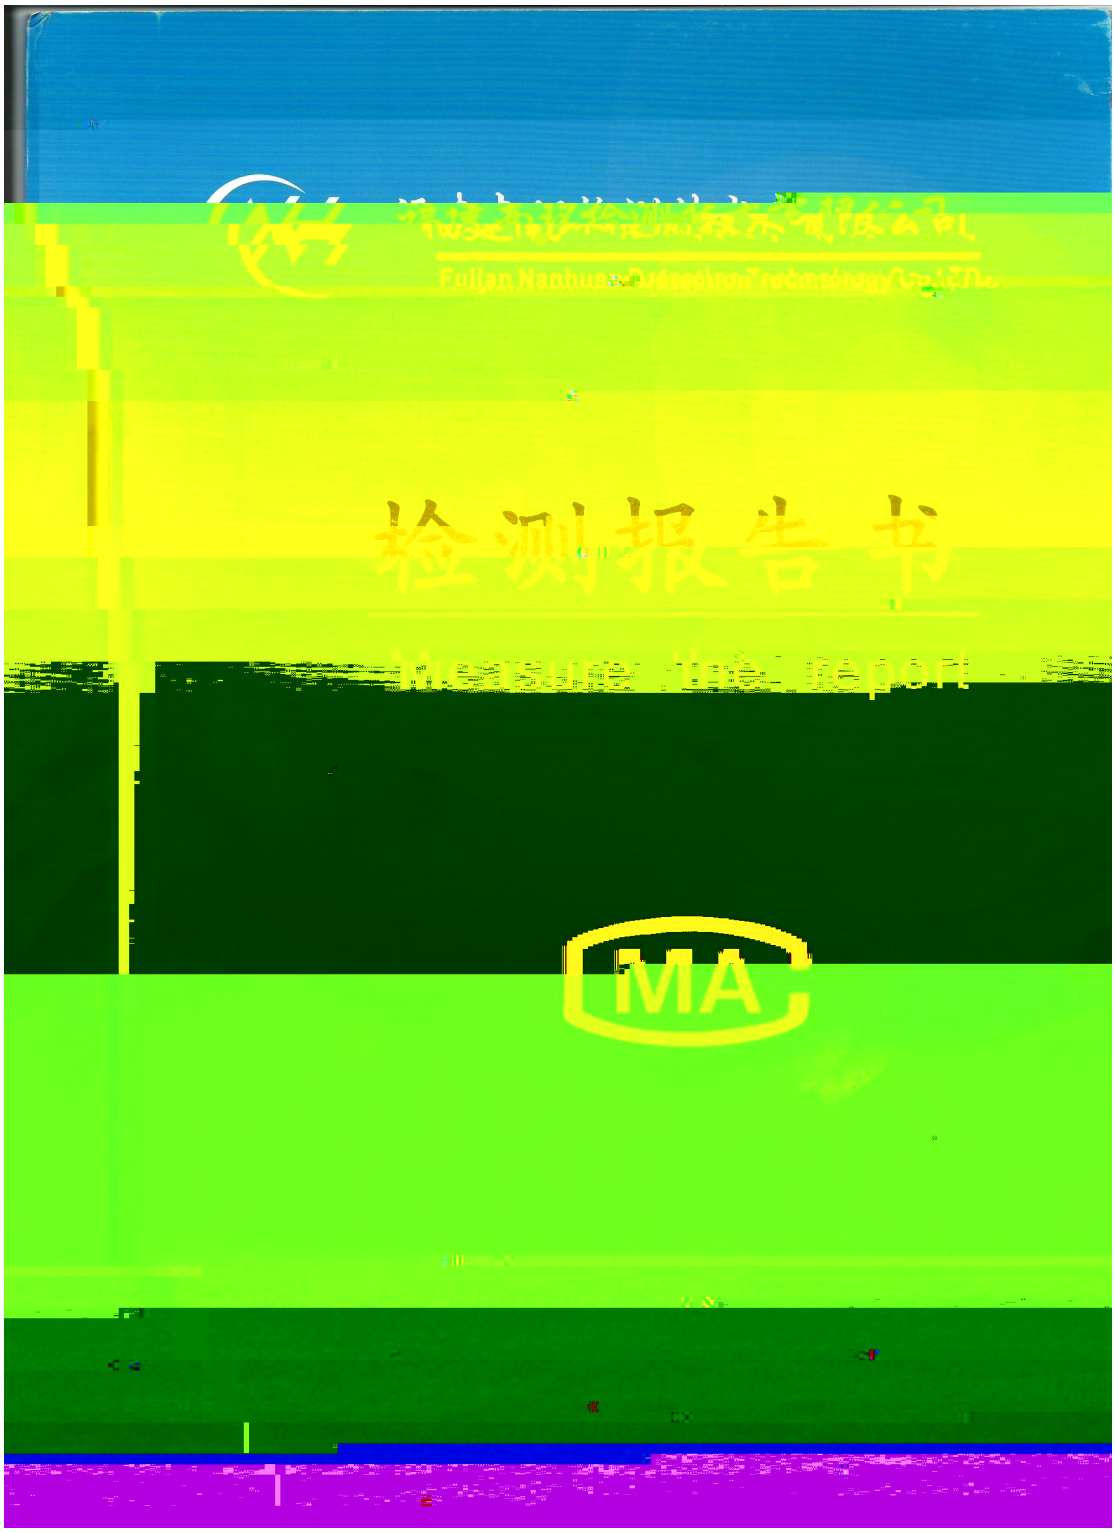

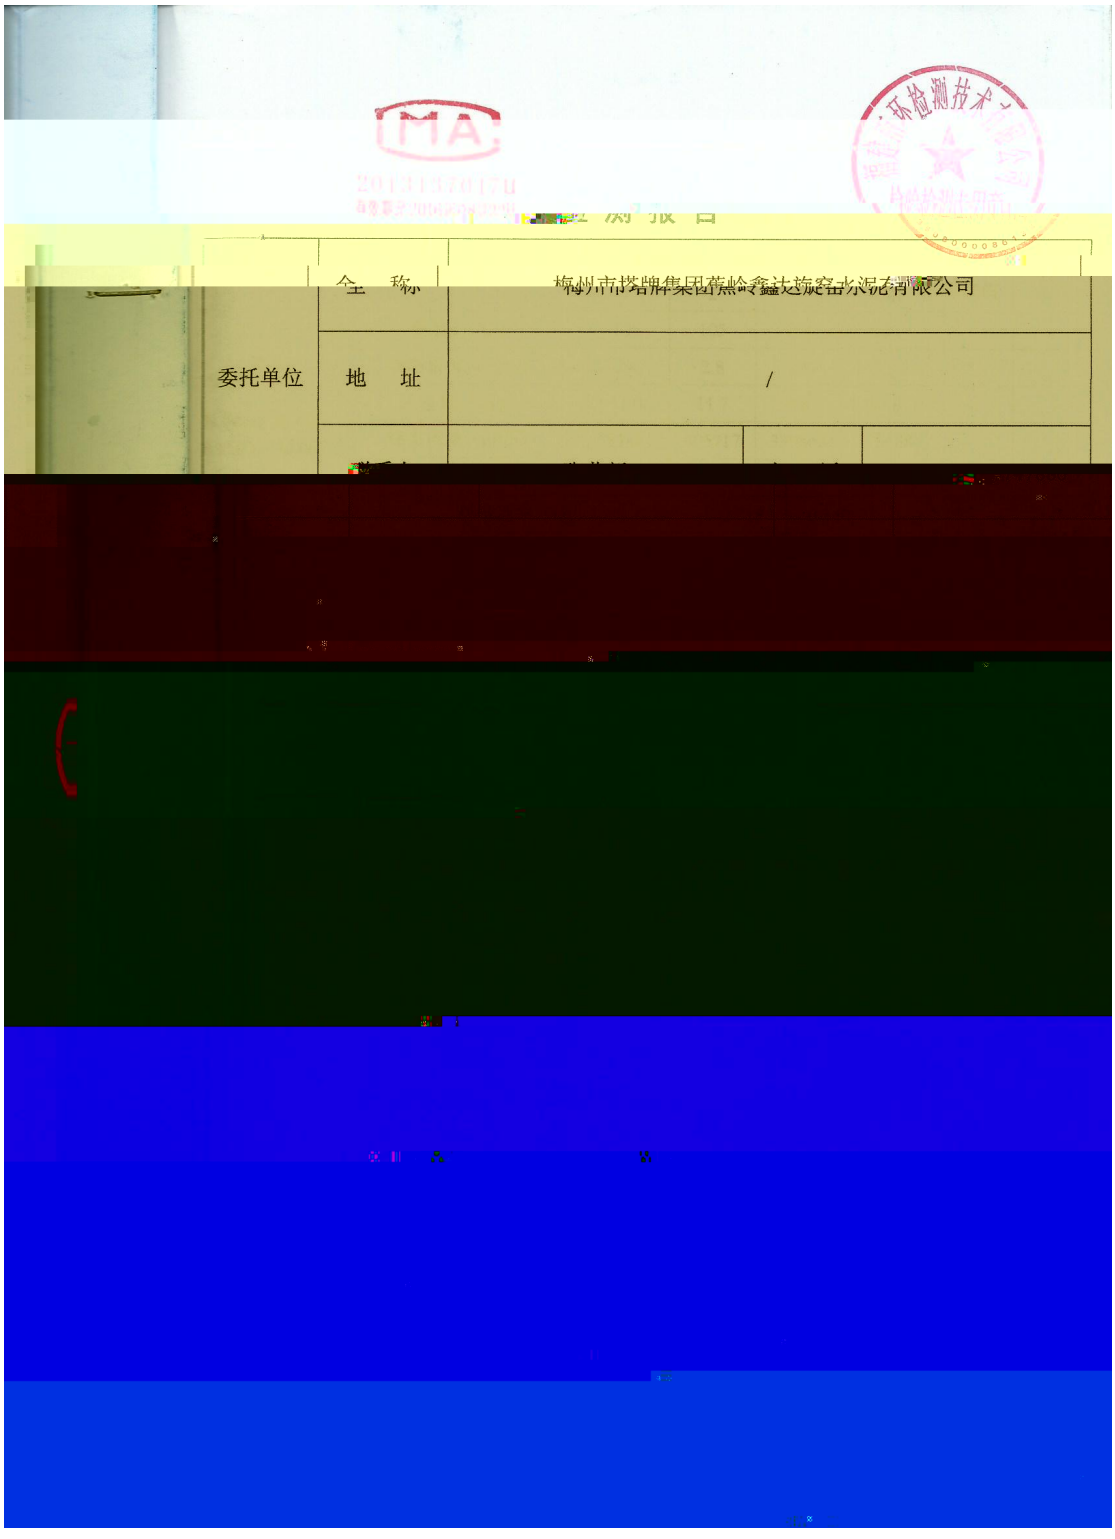

委托单位	全　称	梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
	地　址	/

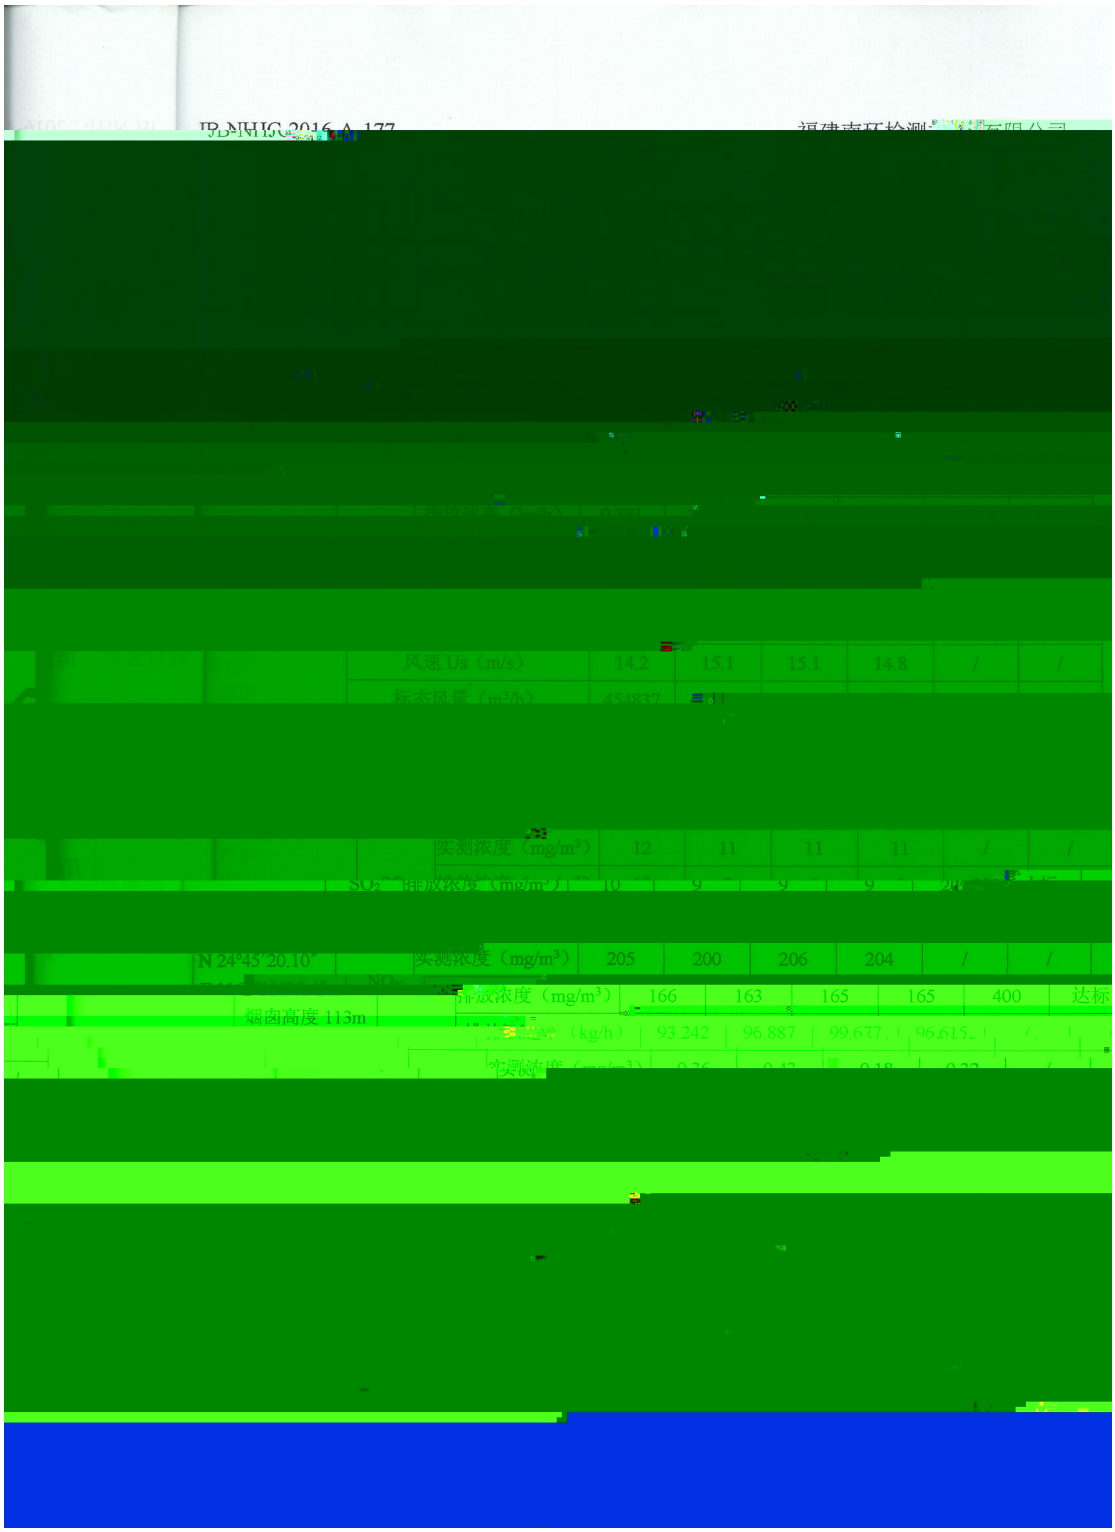

有组织废气检测结果表 2

116°11'17.61" 烟囱高度 20m	粉尘	实测浓度（mg/m³）	5.2	4.0	6.8	5.3	20	达标
		排放速率（kg/h）	0.089	0.077	0.119	0.096	/	/
	烟温 t（℃）		41	41	41	41	/	/
2#包装机	含湿量 Xsw（%）		2.6	2.6	2.6	2.6	/	/
	粉尘	排放速率（kg/h）	0.040	0.035	0.072	0.048	/	/
	烟温 t（℃）		42	42	42	42	/	/
4#包装机	含湿量 Xsw（%）		2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
	风速 Us（m/s）		15.5	15.5	15.5	16.0	/	/
29°44'57.60" 116°11'17.05"	标杆流量（m³/h）		16152	15852	15910	15971	/	/
			0.052	0.059	0.060	0.050	/	/

备注：评价标准：国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表 1（水泥制造）标准。

有组织废气检测结果表3
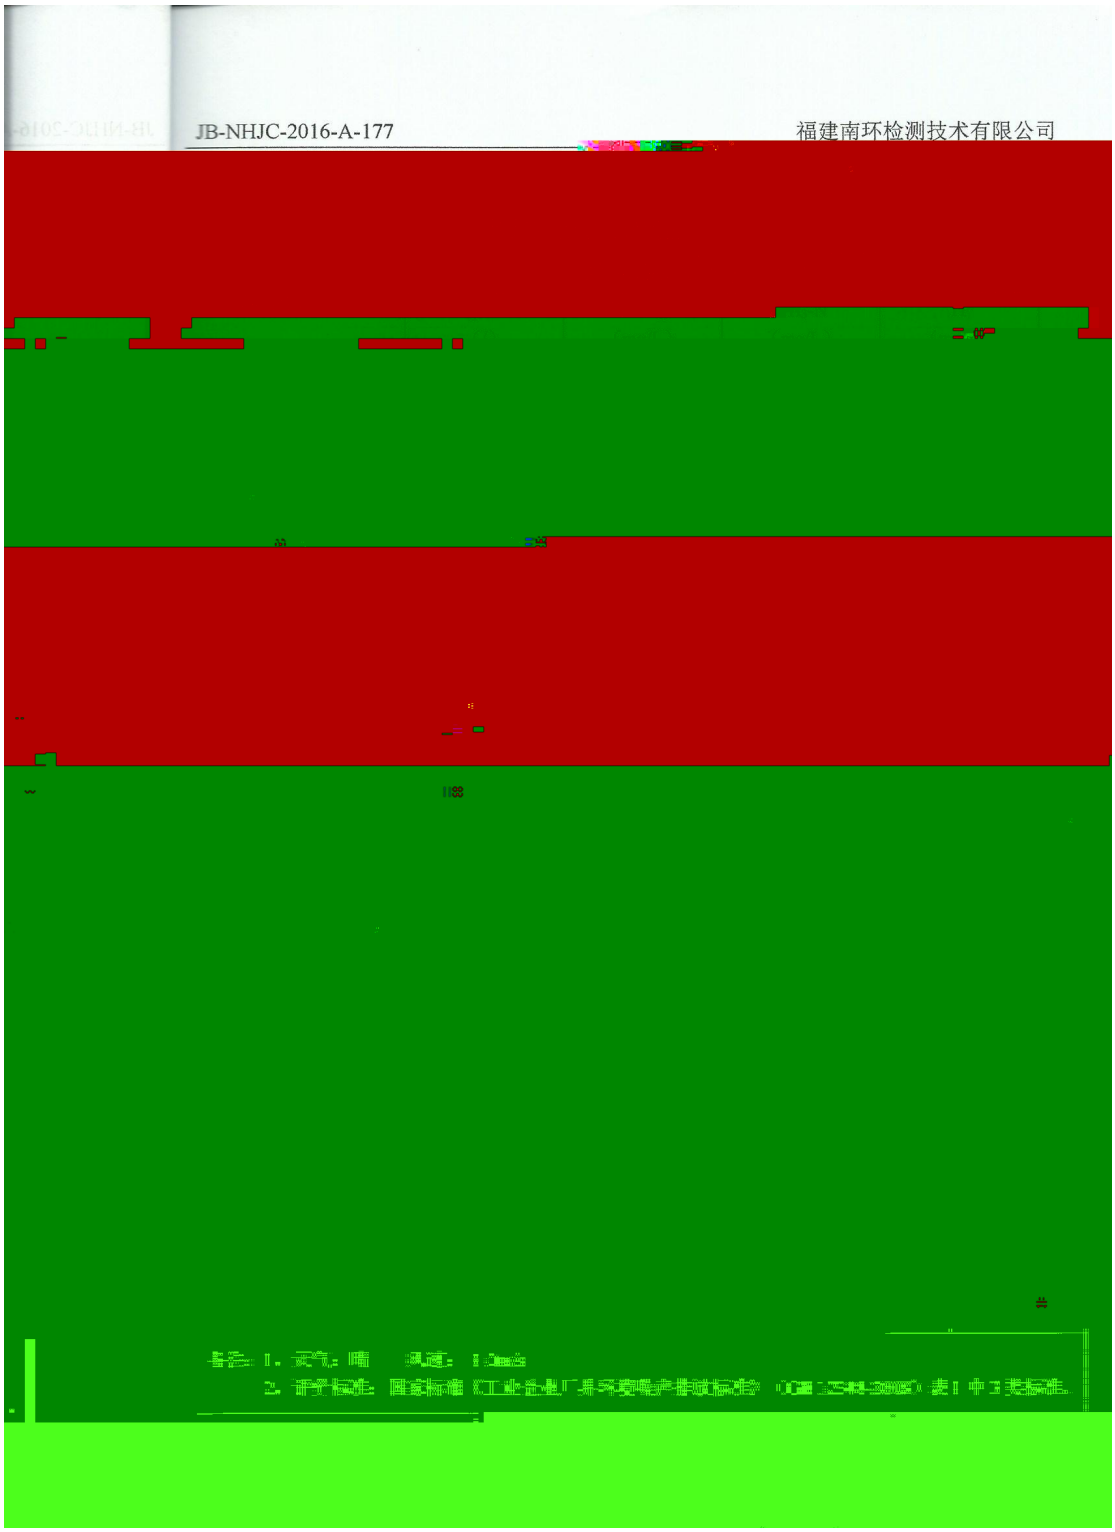
采样点位	检测项目		采样日期：2016 年 05 月 13 日				评价标准值	达标情况
			1	2	3	均值		
6#包装机	烟温 t（℃）		42	42	42	42	/	/
	含湿量 Xsw（%）		2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
N 24°44′58.05″	风速 Us（m/s）		22.2	21.7	19.7	21.2	/	/
E 116°11′18.79	标态风量（m³/h）		22184	21748	19680	21204	/	/
烟囱高度 20m	粉尘	实测浓度（mg/m³）	3.1	2.0	5.5	3.5	20	达标
		排放速率（kg/h）	0.069	0.043	0.108	0.075	/	/
14#沸腾床	烟温 t（℃）		95	96	96	96	/	/
	含湿量 Xsw（%）		2.9	2.9	2.9	2.9	/	/
N 24°45′12.25″	风速 Us（m/s）		6.0	6.8	7.5	6.8	/	/
E 116°11′23.34″	标态风量（m³/h）		20990	22981	24938	22970	/	/
烟囱高度 25m	粉尘	实测浓度（mg/m³）	3.5	2.2	1.1	2.3	20	达标
